ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

- Ausbau Hauptgaszähler der Größen G 2,5 bis einschl. G 25
- Umstellung von Erdgas auf Wärmepumpe

Meldepflichtig und Ausführung nur durch das VIU (Vertragsinstallationsunternehmen)

Oft fehlende Informationen an den Anschlussnehmer/-nutzer

- Wer ist zuständig für den Rückbau der thermischen Leistung ?
- Wer steuert den Anmeldeprozess für Stilllegungen und Rückbau der thermischen Leistung?
- Welcher Arbeitsumfang ist für den Rückbau zu berücksichtigen?
- Welche zusätzlichen Kosten gibt es für den Anschlussnehmer/-nutzer?

Wichtig: die Zählergebühren werden so lange in Rechnung gestellt,
bis der Hauptgaszähler **und** die Stilllegungsmeldung beim Netzbetreiber (NB) eingeht!

ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

Folgende Arbeitsschritte sind vom auszuführenden VIU für die Stilllegung bzw. den Rückbau der thermischen Leistung zu beachten:


- Übermittlung der vollständig ausgefüllten und vom Anschlussnehmer-/nutzer unterschriebenen Stilllegungsmeldung inkl. thermischer Leistung mit dem Formular „Anmeldung einer Gasanlage“
- Spülung der gesamten Gasanlage mit Stickstoff / inertem Gas über die Atmosphäre
- Rückbau der gesamten Gasanlage, soweit möglich (Aufputz verlegter Leitungen meiden)
- Trennung der gasführenden Leitung von der Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- Metallisch dichte Verwahrung an der HAE
- Hauptgaszähler inkl. Regler (sofern vorhanden) mit dem Zählerausbaublatt beim NB abgeben *

ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

*** Sonderfall:** Ausbau des Hauptgaszählers durch die ESTW-Fachabteilung

- Drehkolbengaszähler (DKZ) ≥ G25 ab ca. 400 kW thermischer Leistung
- Hauptsächlich im Industrie- und Gewerbebetrieb
- Stilllegung zwingend meldepflichtig durch das VIU mit dem Formular: „Anmeldung einer Gasanlage“

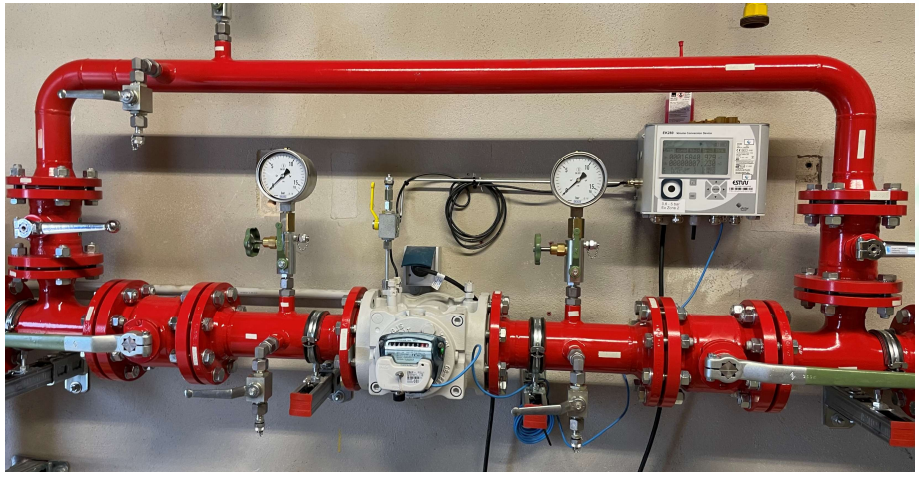




ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

Vor Beginn der Maßnahme:

Übermittlung der **vollständig ausgefüllten** Anmeldung einer Gasanlage mit Dokumentation der thermischen Leistung und der Stilllegungsmeldung

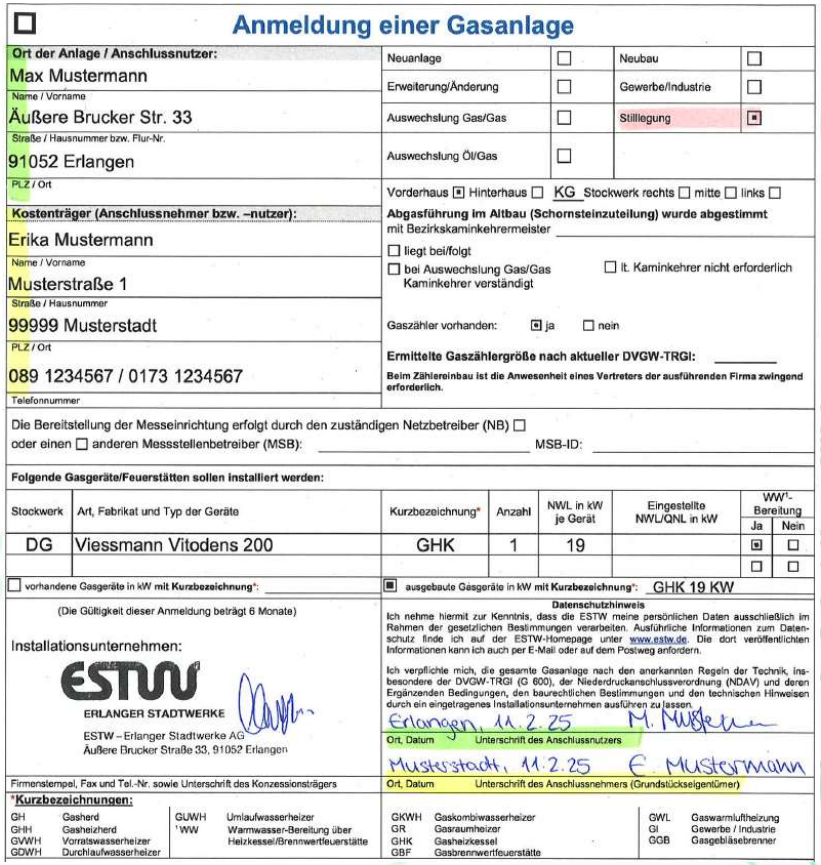

Anmeldung einer Gasanlage

Ort der Anlage / Anschlussnutzer:
Max Mustermann
Name / Vorname
Äußere Brucker Str. 33
Straße / Hausnummer bzw. Flur-Nr.
91052 Erlangen
PLZ / Ort

Kostenträger (Anschlussnehmer bzw. –nutzer):
Erika Mustermann
Name / Vorname
Musterstraße 1
Straße / Hausnummer
99999 Musterstadt
PLZ / Ort
089 1234567 / 0173 1234567
Telefonnummer

Neuanlage ☐ Neubau ☐
Erweiterung/Änderung ☐ Gewerbe/Industrie ☐
Auswechslung Gas/Gas ☐ Stilllegung ☒
Auswechslung Öl/Gas ☐

Vorderhaus ☒ Hinterhaus ☐ KG Stockwerk rechts ☐ mitte ☐ links ☐

Abgasführung im Altbau (Schornsteinzuteilung) wurde abgestimmt
mit Bezirkskaminkehrermeister _____
☐ liegt bei/folgt
☐ bei Auswechslung Gas/Gas Kaminkehrer verständigt ☐ lt. Kaminkehrer nicht erforderlich

Gaszähler vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Ermittelte Gaszählergröße nach aktueller DVGW-TRGI: _____

Beim Zählereinbau ist die Anwesenheit eines Vertreters der ausführenden Firma zwingend erforderlich.

Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch den zuständigen Netzbetreiber (NB) ☐
oder einen ☐ anderen Messstellenbetreiber (MSB): _____ MSB-ID: _____

Folgende Gasgeräte/Feuerstätten sollen installiert werden:

Stockwerk	Art, Fabrikat und Typ der Geräte	Kurzbezeichnung*	Anzahl	NWL in kW je Gerät	Eingestellte NWL/QNL in kW	WW¹-Bereitung Ja	WW¹-Bereitung Nein
DG	Viessmann Vitodens 200	GHK	1	19		☒	☐
						☐	☐

☐ vorhandene Gasgeräte in kW mit **Kurzbezeichnung***: _____
☒ ausgebaute Gasgeräte in kW mit **Kurzbezeichnung***: GHK 19 KW

(Die Gültigkeit dieser Anmeldung beträgt 6 Monate)

Installationsunternehmen:
ESTW
ERLANGER STADTWERKE
ESTW – Erlanger Stadtwerke AG
Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen

Firmenstempel, Fax und Tel.-Nr. sowie Unterschrift des Konzessionsträgers

Datenschutzhinweis
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass die ESTW meine persönlichen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finde ich auf der ESTW-Homepage unter www.estw.de. Die dort veröffentlichten Informationen kann ich auch per E-Mail oder auf dem Postweg anfordern.

Ich verpflichte mich, die gesamte Gasanlage nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DVGW-TRGI (G 600), der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und deren Ergänzenden Bedingungen, den baurechtlichen Bestimmungen und den technischen Hinweisen durch ein eingetragenes Installationsunternehmen ausführen zu lassen.

Erlangen, 11.2.25 M. Musterfrau
Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnutzers

Musterstadt, 11.2.25 E. Mustermann
Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers (Grundstückseigentümer)


*Kurzbezeichnungen:

GH	Gasherd	GUWH	Umlaufwasserheizer	GKWH	Gaskombiwasserheizer
GHH	Gasheizherd	WW	Warmwasser-Bereitung über Heizkessel/Brennwertfeuerstätte	GR	Gasraumheizer
GVWH	Vorratswasserheizer			GHK	Gasheizkessel
GDWH	Durchlaufwasserheizer			GBF	Gasbrennwertfeuerstätte
				GWL	Gaswarmluftheizung
				GI	Gewerbe / Industrie
				GGB	Gasgebläsebrenner

Anmeldeprozess

Nach Beendigung der Maßnahme:

Abgabe des vollständig ausfüllten Zählerausbaublatts inkl. dem abgenommenen Gaszähler (und Regler - sofern vorhanden) im Zählerlager der:
Erlanger Stadtwerke AG
Äußere Brucker Straße 33
91052 Erlangen
(Mo. - Do.: 8 Uhr – 15 Uhr; Fr.: 8 Uhr – 12 Uhr)

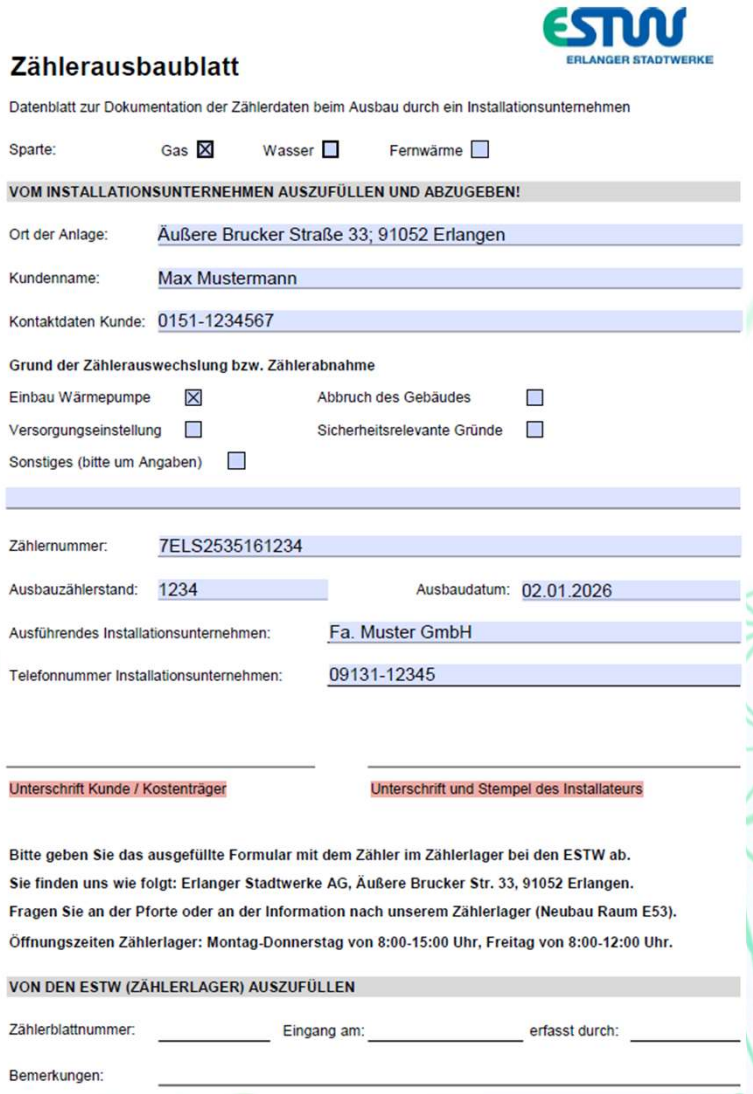

ESTW ERLANGER STADTWERKE

Zählerausbaublatt

Datenblatt zur Dokumentation der Zählerdaten beim Ausbau durch ein Installationsunternehmen

Sparte: Gas ☒ Wasser ☐ Fernwärme ☐

VOM INSTALLATIONSUNTERNEHMEN AUSZUFÜLLEN UND ABZUGEBEN!

Ort der Anlage: Äußere Brucker Straße 33; 91052 Erlangen

Kundenname: Max Mustermann

Kontaktdaten Kunde: 0151-1234567

Grund der Zählerauswechslung bzw. Zählerabnahme

Einbau Wärmepumpe ☒ Abbruch des Gebäudes ☐

Versorgungseinstellung ☐ Sicherheitsrelevante Gründe ☐

Sonstiges (bitte um Angaben) ☐

Zählernummer: 7ELS2535161234

Ausbauzählerstand: 1234 Ausbaudatum: 02.01.2026

Ausführendes Installationsunternehmen: Fa. Muster GmbH

Telefonnummer Installationsunternehmen: 09131-12345

Unterschrift Kunde / Kostenträger

Unterschrift und Stempel des Installateurs

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular mit dem Zähler im Zählerlager bei den ESTW ab.
Sie finden uns wie folgt: Erlanger Stadtwerke AG, Äußere Brucker Str. 33, 91052 Erlangen.
Fragen Sie an der Pforte oder an der Information nach unserem Zählerlager (Neubau Raum E53).
Öffnungszeiten Zählerlager: Montag-Donnerstag von 8:00-15:00 Uhr, Freitag von 8:00-12:00 Uhr.

VON DEN ESTW (ZÄHLERLAGER) AUSZUFÜLLEN

Zählerblattnummer: _____ Eingang am: _____ erfasst durch: _____

Bemerkungen: _____

ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess


Anmeldungen und Formulare finden sie unter folgendem Pfad:

Netze – Installateure – Erdgas – Formulare



ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

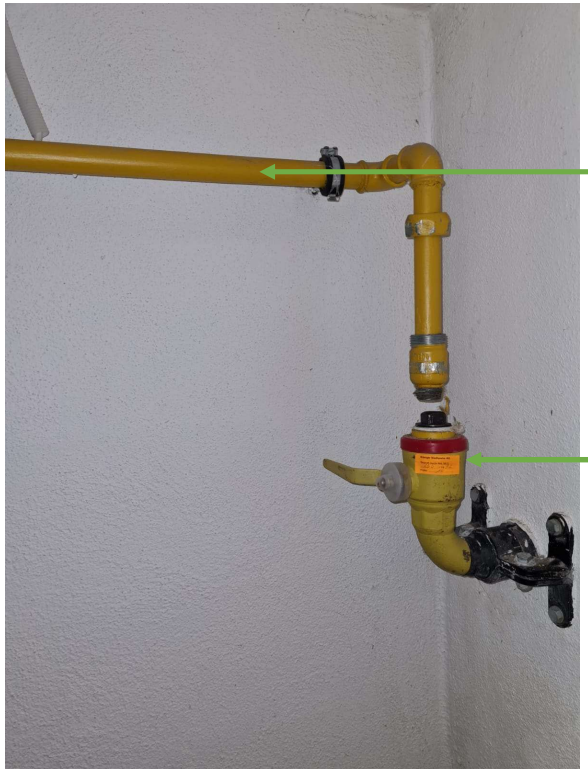

Spülung und Rückbau der bestehenden Gasleitung


Trennung der HAE von der gasführenden Leitung und metallisch dichte Verwahrung. Überprüfung auf Dichtheit.



Anbringung des Hinweisschildes!
(erhältlich bei den ESTW)

ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

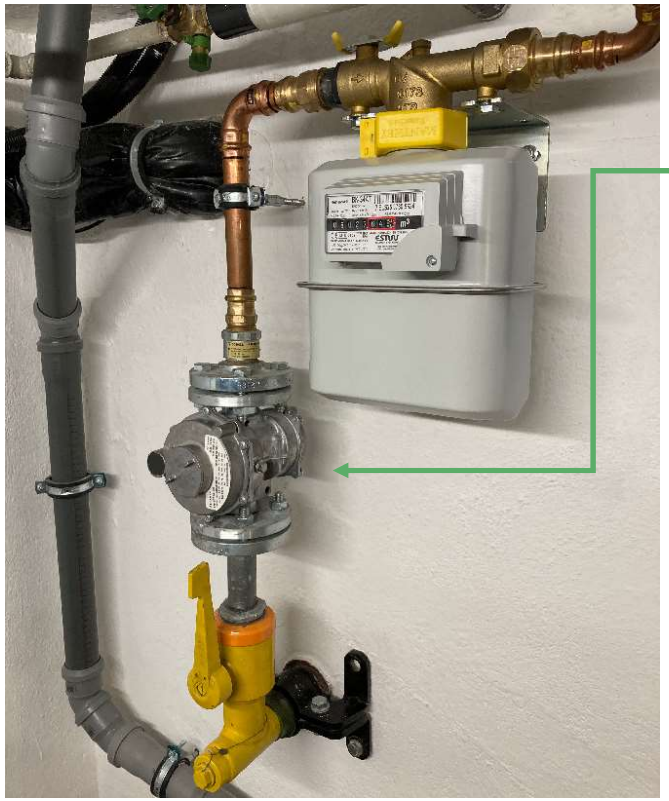

Hausdruckregelgerät (HDR) und Zählerregler (ZR) liegen im Eigentum des zuständigen Netzbetreibers



ESTW ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

Seit dem 01.01.2024 sind alle Anlagen nach § 14a (hierzu zählen auch Wärmepumpen) durch ein VIU über das Datenblatt „Neuanschluss, Veränderung, Stilllegung einer Wärmepumpe / Klimagerät“ anzumelden.

Inbetriebsetzungs-/Stilllegungstermin 11.02.2025

Betreiber der Wärmepumpe / Klimagerät:

Mustermann, Erika (Name, Vorname)	(ggf. Firmenname)
Musterstraße 1 (Straße und Hausnummer)	0172 1234567 (Telefon)
99999 Musterstadt (Postleitzahl/Ort)	erika.mustermann@m.de (E-Mail)

Ausführender Elektrofachbetrieb:

Erlanger Stadtwerke (Firmenname)	ESTW (Eingetragen bei)	123 (unter Nr.)
Äußere Brucker Str. 33 (Straße und Hausnummer)	09131 823-4141 (Telefon)	
91052 Erlangen (Postleitzahl/Ort)	installateure@estw.de (E-Mail)	

ESTW ERLANGER STADTWERKE
ESTW – Erlanger Stadtwerke AG
Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen

Angaben zum Anschlussobjekt:

Äußere Brucker Str. 33 (Straße und Hausnummer)		
91052 Erlangen (Postleitzahl/Ort)		3x63 A (Aktuelle Hausanschlusssicherung)
1ISK0069462669 (Zählernummer)	5982 (Stand 1.8.0)	3x50 A (Aktuelle Zählervorsicherung)

Weitere Angaben in Bezug auf § 14a EnWG:

- ☒ Modul 1 (ein Zähler)
  - ☒ ohne EMS (Energie-Management-System)
  - ☐ mit EMS (Energie-Management-System)
- ☐ Modul 2 (zwei Zähler)
  - ☐ ohne EMS (Energie-Management-System)
  - ☐ mit EMS (Energie-Management-System)

Angaben zum Messkonzept:

Einpolige Darstellung des Messkonzeptes beigefügt: ☒ Ja ☐ Nein

Angaben zum Aufstellungsort:

Lageplan zum Aufstellungsort beigefügt: ☒ Ja ☐ Nein

ESTW ERLANGER STADTWERKE

Angaben zur Wärmepumpe / Klimagerät:

Hersteller Lambda	Typ EU 15L
Art (Funktionsweise der WP)	Luft - Wasser
Elektrische Leistung in kW	5,7
Elektrische Leistung der Zusatzheizung der Raumheizung in kW	8,8
Elektrische Leistung der Zusatzheizung für Warmwasser in kW	8,8
Maximaler Anlaufstrom in A	25

Betriebsweise und Wärmequelle der Elektro-Wärmepumpe:

Betriebsweise	monovalent (bspw. nur Wärmepumpe)
wenn die Betriebsweise bivalent ist	-bitte auswählen-

Bemerkungen:

Unterschrift des ausführenden Elektrofachbetriebs:

Erlangen, 11.02.25 (Ort, Datum)	Unterschrift der eingetragenen Elektrofachkraft	Mauthofer (Name in Druckbuchstaben)

Datenschutzhinweis: Die ESTW verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Abwicklung des Vertrags mit Ihnen. Unsere ausführlichen Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter Datenschutz. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Information auch gerne per E-Mail oder auf dem Postweg zu.

ERLANGER STADTWERKE

Anmeldeprozess

- Umstellung von Erdgas auf Wärmepumpe

Meldepflichtig und Ausführung nur durch das VIU (Vertragsinstallationsunternehmen)

Das Datenblatt finden sie unter folgendem Pfad:

Netze – Installateure – Strom – Formulare

